

昆山市淀山湖镇兴复村村民委员会

兴复村东洋村 46 号、47 号充电桩工程

工
程
结
算
书



昆山市淀山湖镇明达鑫建筑装潢工程队



兴复村东洋村46号、47号充电桩工程 工程


竣工结算总价

签约合同价（小写） 38179.49 （大写）： 叁万捌仟壹佰柒拾玖元肆角玖分

竣工结算价（小写） 38179.34 （大写）： 叁万捌仟壹佰柒拾玖元叁角肆分


发 包 人： 
(单位盖章)


承 包 人： 
(单位盖章)

造价咨询人： 
(单位资质专用章)

或其授权人： 
(签字或盖章)

或其授权人： 
(签字或盖章)

或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
(造价人员签字盖专用章)

核 对 人： 
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021-4-15

核 对 时 间： 2021-4-15

兴复村东洋村46号、47号充电桩工程 工程

竣工结算书

发 包 人：



(单位盖章)

承 包 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



2021年4月15日

兴复村东洋村 46 号、47 号充电桩工程 结算单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价 (元)	合价 (元)
		一、土方工程			1		287.13
1	010101002001	挖一般土方	1、人机配合开挖土方 三类土 不装车 余土就近堆放	m3	7.06	8.68	61.28
2	010103001001	回填方	1、回填土 地面 夯填	m3	2.12	45.83	97.16
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖掘机装车 三类土 2、运距：运距 5km	m3	4.94	26.05	128.69
		二、钢结构			1		37892.21
4	010501001001	垫层	1、非泵送现浇构件 C15 垫层 2、100mm 厚	m3	0.2	767.20	153.44
5	010501003001	独立基础	1、非泵送现浇构件 C30 桩承台独立柱基 2、现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm 以内	m3	3	895.50	2686.50
6	010603001001	实腹钢柱	1、H380-120-8-8 制作安装 运输距离在 5km 以内 2、氟碳漆喷涂	t	1.34	13081.23	17528.85
7	011303001001	采光天棚	膜结构采光天棚	m2	34.5	159.43	5500.34
8	010606013003	零星钢构件	1.5mm 不锈钢天沟制作、安装	m	11.5	181.65	2088.98
9	010606013004	零星钢构件	宣传栏	m2	13.5	735.86	9934.11
合计							38179.34



工程量现场确认单

工程名称：兴复村东洋村 46 号、47 号充电桩工程

编号第 1 号

施
工
单
位

由我公司承建的昆山市淀山湖镇兴复村东洋村 46 号、47 号充电桩工程量已经按照招标文件、施工合同等要求完成，合同内工程量现确定如下：

- 1. 挖一般土方 7.060m³
- 2. 回填方 2.12m³
- 3. 余方弃置 4.940m³
- 4. 垫层 0.2m³
- 5. 独立基础 3m³
- 6. 实腹钢柱 1.34T
- 7. 采光天棚 34.5 m²
- 8. 零星钢构件 13.5 m²
- 9. 零星钢构件 11.5m



经办人：



负责人：

项目经理部（章）：

日期：

建
设
单
位

业意见：



建设单位（章）：

张 徐双 现场拉线 万和

业主代表：



年 月 日

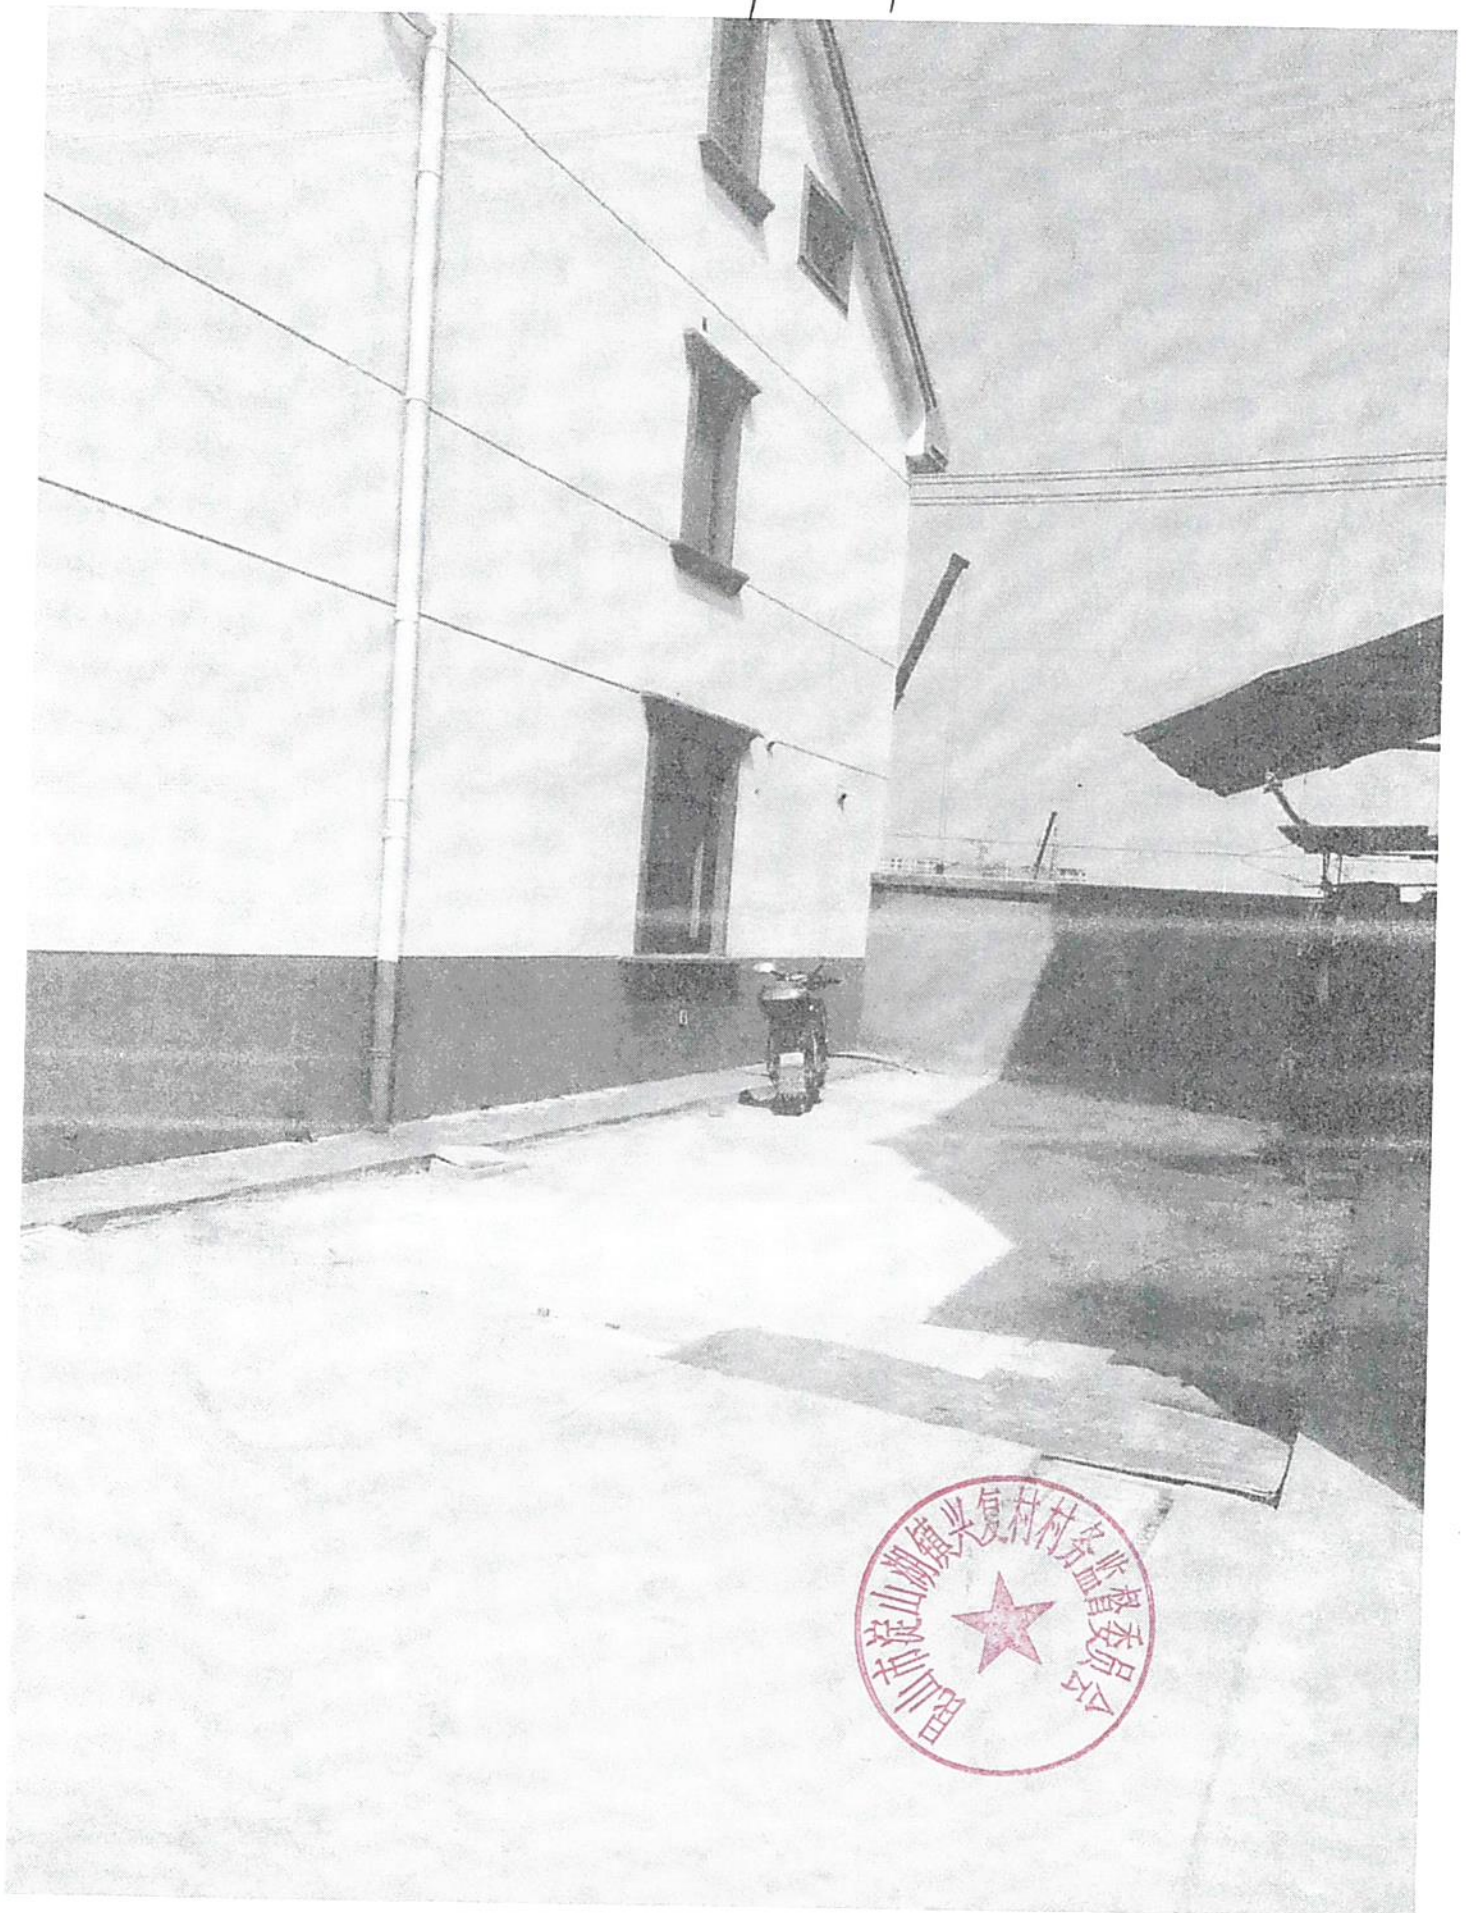
工程竣工验收证明书

工程名称：兴复村东洋村 46 号、47 号充电桩工程

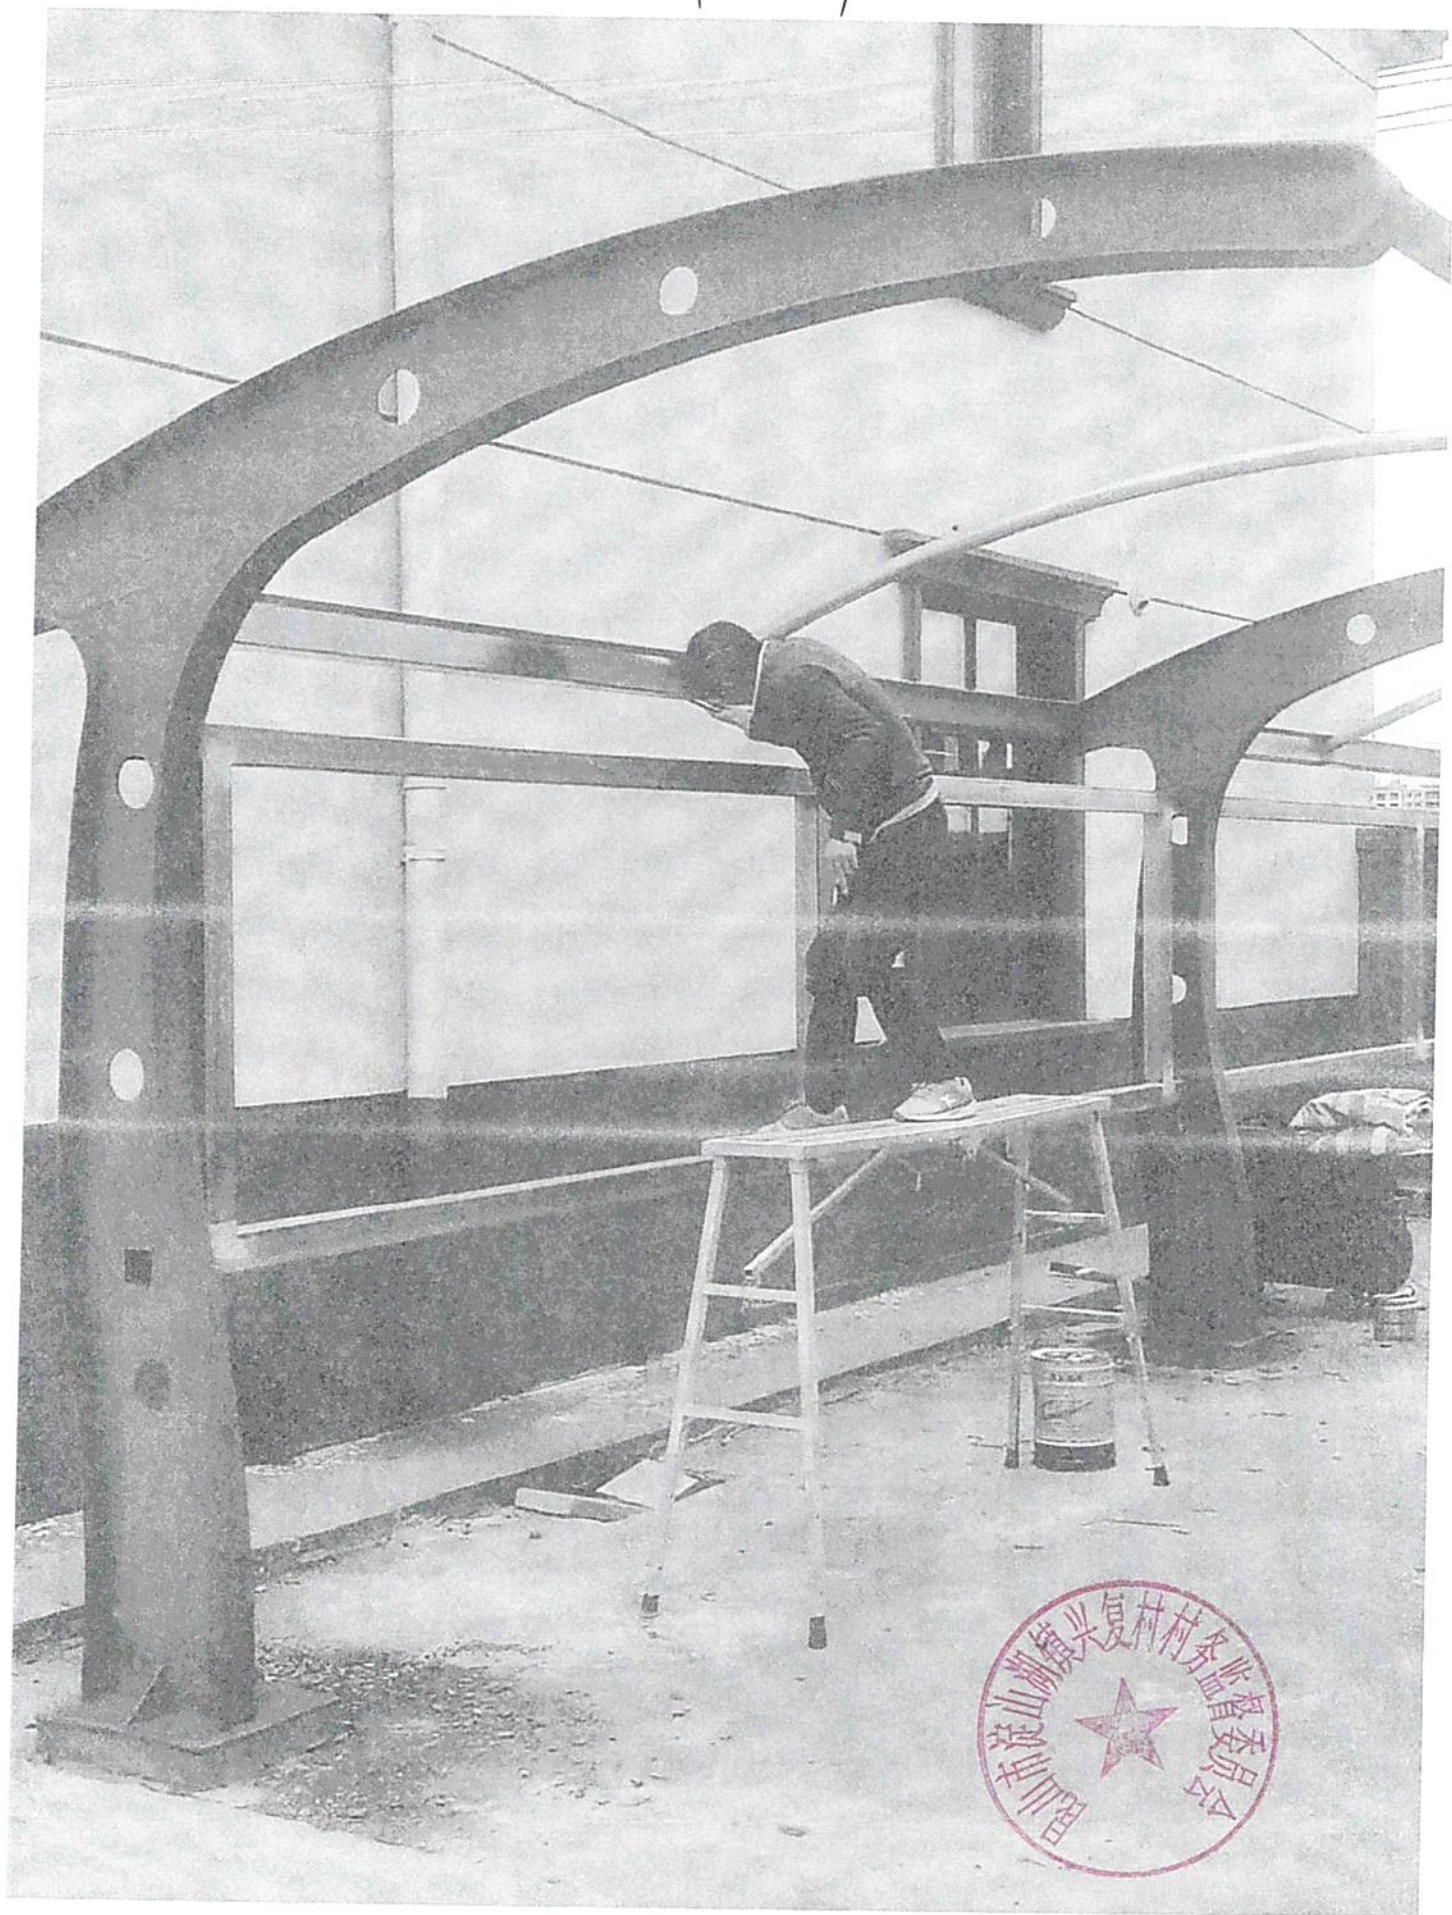
竣工日期： 年 月

建设单位	昆山市淀山湖镇兴复村村民委员会			监理单位	/				
施工单位	昆山市淀山湖镇明达鑫建筑装饰装潢工程队			设计单位	/				
建筑面积	/	工程造价	38179.49	结构层次	/	开工日期	2021/3/10- 2021/4/10	质量等级	合格
验收意见	工程已全部竣工验收，形成如下意见： 1、施工资料，隐蔽工程资料等技术资料齐全。 2、施工处实体隐蔽较好，符合设计及施工规范要求。 3、工程实体尺寸符合设计及施工规范要求。 4、经建设单位验收，本工程质量合格，同意竣工验收，交付使用。								
施工单位		建设单位		有关单位					
技术负责人 邵明达 (签字)		工地代表： 单位负责人： (签字)		参加人员： (签字)					
(公章)		(公章)		(公章)					

施工前照片



施工中照片



施工后照片

