

工程量验收清单

工程名称：兴复村西洋村西北侧绿化工程

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	备注
1	垂柳	胸径16.1-18cm, 高度450-550cm, 冠幅351-400cm	株	5	
2	枫香	胸径16.1-18cm, 高度451-500cm, 冠幅300-400cm	株	11	
3	榉树	胸径15.1-18cm, 高度451-500cm, 冠幅300-400cm	株	2	
4	香樟	胸径20.1-22cm, 高度400-500cm, 冠幅300-400cm	株	1	
5	栎树	胸径16.1-18cm, 高度450-550cm, 冠幅300-400cm	株	7	
6	金桂	高度331-360cm, 冠幅251-300m	株	11	
7	垂丝海棠	地径5.1-6cm, 高度201-250cm, 冠幅201-250cm	株	241	
8	晚樱	地径6.1-8cm, 高度301-330cm, 冠幅250-300cm	株	6	
9	海桐球	蓬径121-150cm	株	3	
10	金森女贞球	冠幅101-120cm	株	6	
11	红叶石楠球	冠幅121-150cm	株	5	
12	百慕大草坪	满铺百慕大草坪;冬植黑麦草籽	m2	6868	
13	红叶石楠	高度31-40cm 蓬径26-30cm, 36株/平方	m2	243	
14	金边黄杨	高度31-40cm 蓬径21-40cm, 36株/平方	m2	113	
15	金森女贞	高度31-40cm 蓬径31-40cm, 36株/平方	m2	33	
16	红花檵木	高度31-40cm 蓬径25-30cm, 36株/平方	m2	21	
17	毛娟	高度31-40cm 蓬径31-40cm, 25株/平方	m2	83	
18	整理绿化用地	人机配合整理绿化用地	m2	7361	
建设单位:  王述平 工程经手方 校实		监理单位:		施工单位:  顾大明	

竣工验收申请表

工程名称	兴复村西洋村西北侧绿化工程	工程地点	兴复村西洋村西北侧
建设单位	昆山市淀山湖镇兴复村村民委员会	绿化面积	
设计单位		合同开竣工日期	2020.12.01-2021.02.28
勘察单位		实际开工日期	2020.12.01
监理单位		实际完成日期	2021.02.28
施工单位	苏州徐家园林建设有限公司	实际工期	90
合同造价（万元）	38.10万元	完成造价（万元）	38.08

竣工条件具备情况

项目内容	施工单位自检情况
完成工程设计和合同约定情况	已全部完成，工程质量符合合同约定标准
技术档案和施工管理资料	基本齐全，符合要求
主要材料、构配件和设备进场报验、工序报验、施工测量报验情况	基本齐全，符合要求
变更备案	已按要求进行变更备案
竣工图	已按现场绘制，符合要求
监理单位预验收	已预验收合格，符合要求
责令整改问题的执行情况	已整改到位，符合要求
工程款支付情况	已按合同约定进行支付
工程质量保证书	已签署，符合要求

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

项目经理： 

技术负责人：

法定代表人（加盖公章）：

2021 年 2 月 27 日

监理单位意见：

总监理工程师（加盖公章）：

年 月 日

建设单位甲方代表意见：

年 月 日

建设单位负责人（加盖公章）：


年 月 日

结 算 书

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	单价	总价	交付期
1	栽植乔木	1、乔木种类：垂柳 2、乔木胸径 16.1-18cm，高度 450-550cm，冠幅 351-400cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	5	1364.77	6823.85	90 天
2	栽植乔木	1、乔木种类：枫香 2、乔木胸径 16.1-18cm，高度 451-500cm，冠幅 300-400cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	11	2274.92	25024.12	90 天
3	栽植乔木	1、乔木种类：榉树 2、乔木胸径 15.1-18cm，高度 451-500cm，冠幅 300-400cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	2	4461.65	8923.30	90 天
4	栽植乔木	1、乔木种类：香樟 2、乔木胸径 20.1-22cm，高度 400-500cm，冠幅 300-400cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	1	4137.20	4137.20	90 天
5	栽植乔木	1、乔木种类：栾树 2、乔木胸径 16.1-18cm，高度 450-550cm，冠幅 300-400cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	7	2570.41	17992.87	90 天

6	栽植灌木	1、灌木种类：金桂 2、灌木高度 331-360cm，冠幅 251-300m 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	11	2759.27	30351.97	90 天
7	栽植灌木	1、灌木种类：垂丝海棠 2、灌木地径 5.1-6cm，高度 201-250cm，冠幅 201-250cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	241	360.29	86829.89	90 天
8	栽植灌木	1、灌木种类：晚樱 2、灌木地径 6.1-8cm，高度 301-330cm，冠幅 250-300cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	6	391.24	2347.44	90 天
9	栽植灌木	1、灌木种类：海桐球 2、灌木蓬径 121-150cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	3	196.33	588.99	90 天
10	栽植灌木	1、灌木种类：金森女贞球 2、灌木冠幅 101-120cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	6	199.00	1194.00	90 天
11	栽植灌木	1、灌木种类：红叶石楠球 2、灌木冠幅 121-150cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年	株	5	262.06	1310.30	90 天
12	铺种草皮	满铺百慕大草坪;冬植黑麦草 籽成活率养护期一年	m2	6868	17.72	121700.96	90 天

13	栽植色带	1、色带种类：红叶石楠 2、色带高度 31-40cm 蓬径 26-30cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年 5、备注：36 株/平方 成活率 100%	m2	243	130.41	31689.63	90 天
14	栽植色带	1、色带种类金边黄杨 2、色带高度 31-40cm 蓬径 21-40cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年 5、备注：36 株/平方 成活率 100%	m2	113	104.99	11863.87	90 天
15	栽植色带	1、色带种类：金森女贞 2、色带高度 31-40cm 蓬径 31-40cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年 5、备注：36 株/平方 成活率 100%	m2	33	73.73	2433.09	90 天
16	栽植色带	1、色带种类：红花继木 2、色带高度 31-40cm 蓬径 25-30cm 3、养护标准：三级 4、养护期：1 年 5、备注：36 株/平方 成活率 100%	m2	21	97.26	2042.46	90 天

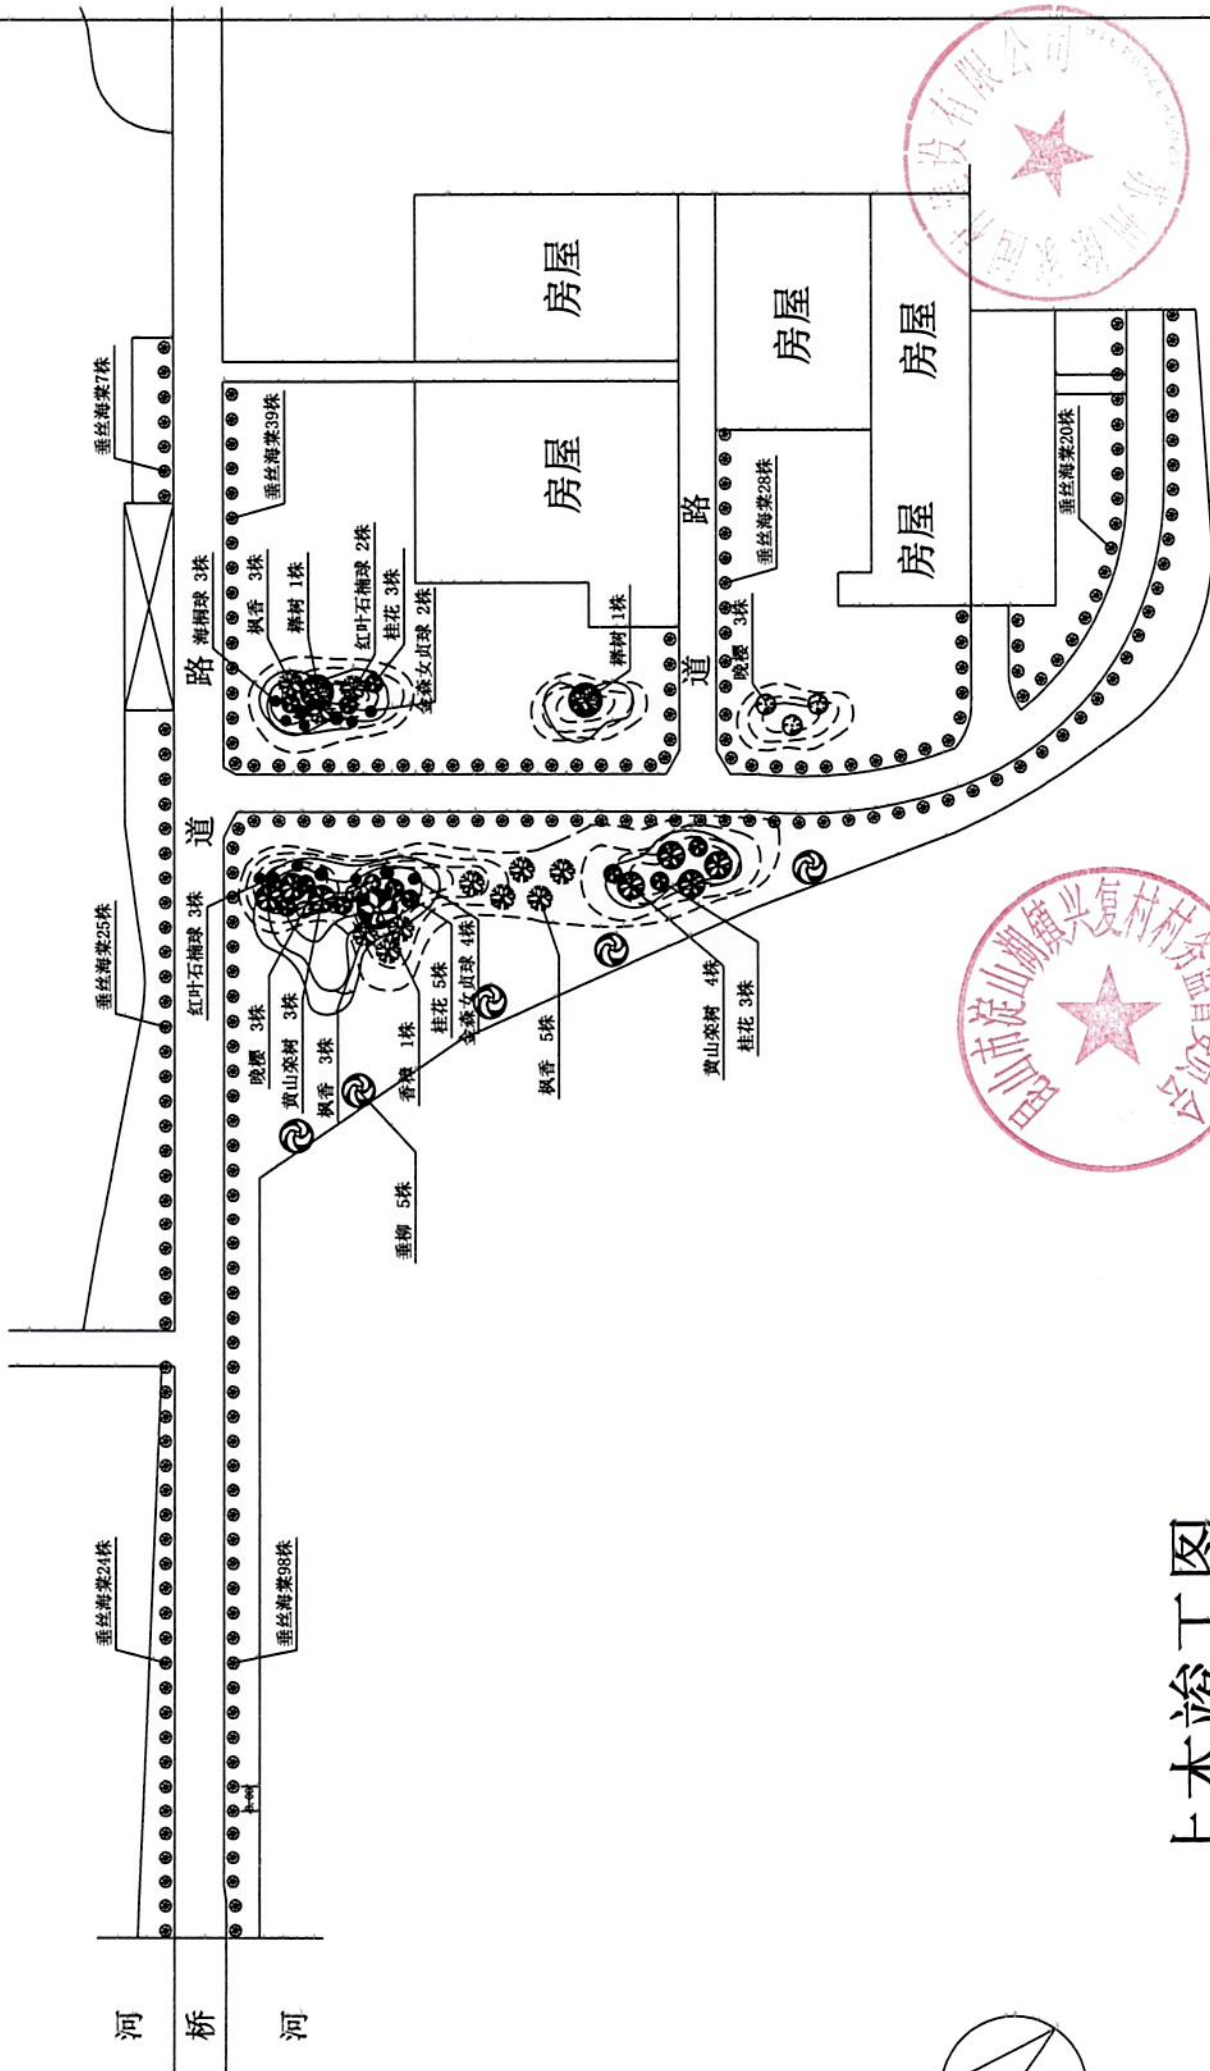

上木竣工图



下木竣工图



兴复村西洋村西北侧绿化工程施工前照片





兴复村西洋村西北侧绿化工程施工中照片





兴复村西洋村西北侧绿化工程施工后照片

